

ESTRATÉGIA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2021 – 2026

RELATÓRIO EXECUÇÃO 2021



CTIC

Conselho para as Tecnologias de Informação
e Comunicação na Administração Pública

SUMÁRIO EXECUTIVO

Com a publicação da RCM 131/2021, o Conselho de Ministros resolve no ponto 2, determinar que a Estratégia e o Plano de Ação, complementados com o detalhe das iniciativas setoriais e com informação de monitorização das medidas e do respetivo impacto, são disponibilizados pela Agência para a Modernização Administrativa, I. P., bem com, no ponto 3, estabelecer que compete à direção do comité técnico do CTIC coordenar a implementação da Estratégia e do Plano de Ação.

A Direção do Comité Técnico do CTIC vem desta forma apresentar o relatório de execução de 2021 relativo à Estratégia para a Transformação Digital da Administração Pública 2021-2026.

Este relatório tem como base o ponto de situação da execução dos projetos, recolhido através do Plano de Ação Setorial até à data de 31 de dezembro de 2021, compreendendo os seguintes elementos, (i) estado do projeto, (ii) % de execução do projeto, (iii) montante em € já executado do projeto, (iv) montante de benefícios económicos calculado para o projeto, em €.

ENQUADRAMENTO DA ESTRATÉGIA

LINHAS ESTRATÉGICAS

A ESTRATÉGIA PARA AS TIC NA AP PARA O PERÍODO DE 2021 ATÉ 2026 DESENVOLVE-SE NAS SEGUINTE LINHAS ESTRATÉGICAS

Visão

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MAIS DIGITAL

MELHORES SERVIÇOS, MAIOR VALOR
mais perto dos cidadãos e empresas

Linhas Estratégicas

Impacto no
Cidadão e
Empresas

Criar
condições

1. SERVIÇOS PÚBLICOS DIGITAIS

2. VALORIZAÇÃO DO PAPEL DOS DADOS

3. ARQUITETURAS
DE REFERENCIA

4. COMPETÊNCIAS
TIC

5. INFRAESTRUTURAS
E SERVIÇOS TIC

6. SEGURANÇA E
CONFIANÇA

EXECUÇÃO DE 2021 DE ESTRATÉGIA DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 2021-2026


DADOS GLOBAIS CONSOLIDADOS

O Plano de Ação Setorial para a Transformação Digital da AP 21-23 apresenta uma execução de 58% de projetos iniciados e concluídos.

292 projetos propostos para 2021

147 projetos iniciados

22 projetos concluídos

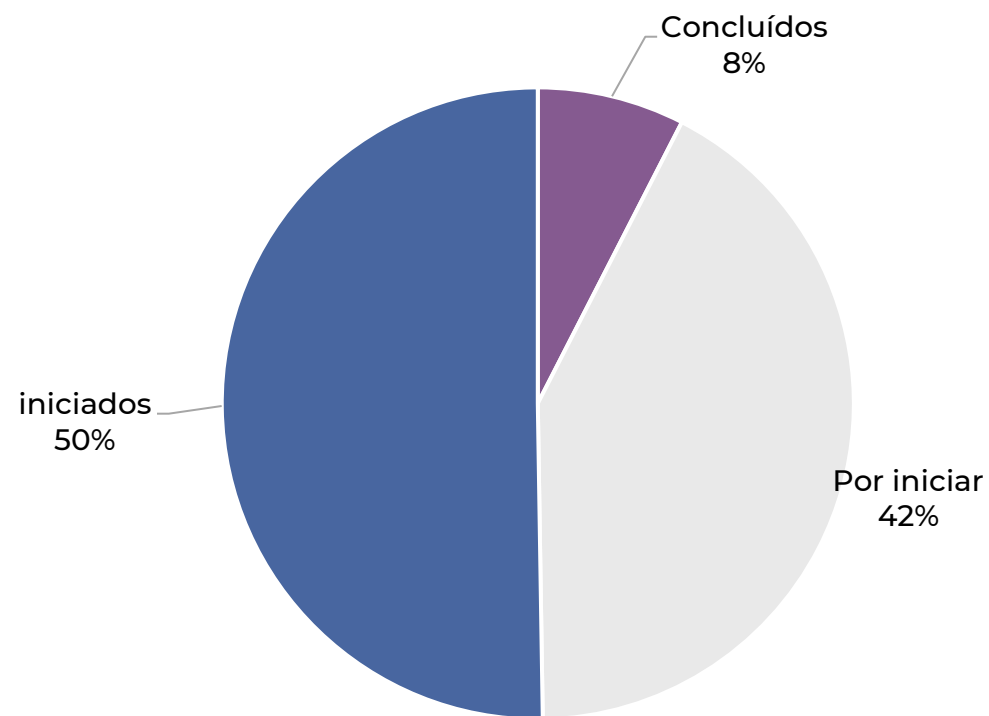

DADOS GLOBAIS CONSOLIDADOS

A Estratégia para a Transformação Digital da AP 21-23 apresenta uma execução financeira de 21 milhões de € relativamente aos projetos iniciados e concluídos. Corresponde a 17% do investimento previsto para o ano de 2021.

INVESTIMENTOS (Milhões €)

Previsto	126	
Executado	21	17 %

DADOS CONSOLIDADOS - AÇÕES TRANSVERSAIS

	Concluídas	Por Concluir
LE I – Serviços Públicos Digitais	1	3
LE II – Valorização dos Dados	1	2
LE III – Arquiteturas de Referência	-	2
LE IV – Competências TIC	2	-
LE V – Infraestruturas e Serviços TIC	-	-
LE VI – Segurança e Confiança	2	1

DADOS CONSOLIDADOS

Área Governativa	Nº Ações Iniciadas	Nº Ações Concluídas	% Ações Concluídas	Inv. Realizado	% Inv. Realizado
Administração Interna	5	1	5%	334 K€	6%
Agricultura	12	1	4%	52 K€	3%
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior	11	1	8%	579 K€	64%
Coesão Territorial*					
Cultura	5	0	0%	-	-
Defesa Nacional	15	4	13%	472 K€	18%
Economia de Transição Digital	3	0	0%	185 K€	15%
Educação	15	2	11%	1 204 K€	46%
Justiça	7	0	0%	1 004 K€	24%
Modernização do Estado e da Administração Pública	1	0	0%	-	-
Saúde*					
Finanças	12	0	0%	2 128 K€	14%
Infraestruturas e Habitação	15	3	12%	672 K€	28%
Ambiente e da Ação Climática	17	2	7%	1 023 K€	27%
Mar*					
Planeamento	1	0	0%	750 K€	75%
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social	18	0	0%	9 426 K€	37%
Negócios Estrangeiros	9	1	4%	2 300 K€	20%
Presidência de Conselho de Ministros	9	1	7%	390 K€	16%
Total	155	16	6%	20 519 K€	16%

CONCLUSÕES

EVIDÊNCIAS

A implementação da Estratégia para a Transformação Digital da AP 21-26 no ano de 2021 apresenta uma baixa taxa de execução financeira e de projetos iniciados e concluídos.

A aprovação tardia da Estratégia – já no 2º semestre do ano – justifica a maioria dos resultados obtidos, tendo a generalidade das áreas governativas tido dificuldade na contratação pública associada à execução dos mesmos. Contudo, a disponibilização tardia de fundos para a realização das ações propostas – nomeadamente ao nível do Programa de Recuperação e Resiliência – é outra das razões associadas à execução existente.

Prevê-se que sejam realizados pelas áreas governativas os projetos setoriais que ficaram por iniciar/concluir em 2021, sendo que os projetos transversais estão já em implementação pelas diversas áreas governativas.



CTIC

Conselho para as Tecnologias de Informação
e Comunicação na Administração Pública



REPÚBLICA
PORTUGUESA
